



MUNICIPIO DE LOJA

GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

CONTRATO No. 065-2018

"CONSTRUCCION DE LA PISTA DE SKTE EN EL PARQUE COLINAR PUCARA PODUCARPUS"

COMPARECIENTES.

En la ciudad de Loja, a los 26 días del mes de Julio del año dos mil dieciocho, se constituyen en representación del Municipio de Loja por una parte, el ingeniero Ángel Garcés Ortega, Administrador, la ingeniera Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, en calidad de delegados; y el ingeniero Jorge Montaña Ordóñez, Fiscalizador, y por otra el Ing. Rodman Oscar Ruiz Ludeña, Contratista de la Institución, con el objeto de proceder a formular la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**, bajo las siguientes cláusulas y términos.

1. ANTECEDENTES:

- 1.1. Con fecha 06 de febrero de 2018, se suscribió entre el Municipio de Loja y el Ing. Rodman Oscar Ruiz Ludeña, el Contrato de obra cuyo objeto es la **"CONSTRUCCION DE LA PISTA DE SKTE EN EL PARQUE COLINAR PUCARA PODUCARPUS"**.
- 1.2. El monto del contrato asciende a la cantidad de **OCHENTA MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 21/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica** no incluye IVA. (USD \$ 80.494,21 sin IVA).
- 1.3. El plazo contractual es de **NOVENTA (90) días calendario**, contados a partir de suscripción del contrato, según consta en la Cláusula **OCTAVA** del contrato: Plazo.
- 1.4. Con fecha 22 de mayo de 2018, el Contratista recibe el anticipo por un monto de **\$ 24.148,26 USD (VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 26/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)**, que equivale al 30% del monto total del contrato.
- 1.5. **LA CONTRATANTE**, designa al ingeniero Ángel Garcés Ortega, en calidad de Administrador de Contrato, mediante memorando No. ML-GOP-2018-0031, y al ingeniero Jorge Montaña Ordóñez, en calidad de Fiscalizador del contrato, mediante memorando No. ML-GOP-2017-4007.
- 1.6. Mediante oficio No. ML-GOP-TI-JTMO-2018-0207-OF, dirigido al contratista se suspende la construcción de obra, hasta que la Dirección de Planificación, envíe los nuevos diseños y presupuestos, en vista a inconvenientes en el diseño estructural original.
- 1.7. Mediante oficio No. ML-GOP-TI-JTMO-2018-0271-OF, dirigido al contratista, se dispone el reinicio de los trabajos, en vista que la Dirección de Planificación, envió el nuevo diseño y presupuesto.
- 1.8. Con fecha 02 de julio del 2018, finaliza los trabajos del Contrato.
- 1.9. Mediante oficio s/n, del 03 de julio del 2018, el Contratista, solicita a la Lcda. Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa de Loja, se digna disponer a quien corresponda se realice la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la obra.
- 1.10. Con sumilla inscrita en el trámite 2018-EXT-25503, la Máxima Autoridad remite a la Gerencia de Obras Públicas y se pone a conocimiento del Fiscalizador. A su vez, mediante memorando No. ML-GOP-TI-JTMO-2018-1359-M, el Fiscalizador se dirige al Administrador, informando que la obra está finalizada y es procedente solicitar la comisión para recepción provisional.

- 1.11. Mediante memorando No. ML-GOP-TV-AAGO -2018-1444-M, el Administrador del contrato, y con la aprobación de la ing. Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura, y con el visto bueno del ing. Fausto Zurita Álvarez, Sub-gerente de obras públicas, se dirigen al Gerente de Obras Públicas, solicitando que se continúe el trámite de para la designación de la comisión de Recepción Provisional.
- 1.12. Con fecha 25 de julio de 2018, el Gerente de Obras Públicas, mediante memorando N° ML-GOP-2018-2281-M, solicita la conformación de la Comisión de Recepción a la máxima Autoridad, y sugiere al ingeniero Ángel Garcés Ortega como Administrador del contrato, y la ingeniera Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Públicas, respectivamente.
- 1.13. Con fecha 25 de julio del 2018, la licenciada Piedad Pineda Ludeña, Alcaldesa de Loja, mediante memorando N° ML-GOP-2018-2282-M, designa la comisión de recepción conformada por el ingeniero Ángel Garcés Ortega como Administrador del contrato, y la ingeniera Carmen Maza Reinoso, Coordinadora de Infraestructura de la Gerencia de Obras Públicas, respectivamente.

2. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Para efectos de la recepción, los comparecientes en conocimiento proceden a recorrer integralmente la obra para constatar el fiel cumplimiento del contrato, donde la comisión verifica la obra ejecutada, dejando constancia que se ejecutó los siguientes trabajos:

ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Replanteo y nivelación en área abierta	M2	890.940	0.84	748.39
2	Picada de piso de hormigón	M2	155.87	8.18	1275.02
3	Demolición de estructura de hormigón	M3	13.66	85.18	1163.56
4	Excavación máquina en material sin clasificar	M3	0.00	2.71	0.00
5	Excavación a manual en material sin clasificar	M3	12.40	11.70	145.08
6	Excavación de zanja a máquina en material sin clasificar	M3	122.59	2.93	359.19
7	Relleno compactado compactador mecánico (material de sitio)	M3	74.58	8.49	633.18
8	Relleno comp. mecan. (material de mejoramiento)		177.20	18.38	3256.94
9	Desalojo de escombros a volqueta cargada manual		78.29	6.44	504.19
10	Desalojo de material en volquete Ds 5km, cargada a máquina	M3	0.00	4.73	0.00
11	Replantillo de piedra E=15cm	M3	1.32	36.69	48.43
12	Replantillo de hormigón simple f'c=140 kg/cm2	M3	1.82	123.98	225.64
13	Hormigón simple f'c=180 kg/cm2, incluye encofrado en bordillo canal	M3	0.00	202.78	0.00
14	Hormigón simple f'c=210 kg/cm2, en piso (pistas de skate y gradas)	M3	37.28	182.70	6811.06
15	Muro de simple f'c=210 kg/cm2 + encofrado	M3	70.14	235.01	16483.60
16	Hormigón ciclópeo 60% hormigón simple f'c=180 kg/cm2 + piedra 40 por ciento	M3	174.90	125.80	22002.42
17	Hormigón simple f'c=210 kg/cm2+ impermeabilizante incluye encofrado	M3	0.00	213.49	0.00
18	Malla electrosoldada de 100x100x8mm	M2	1001.97	12.40	12424.43
19	Acero de refuerzo	KG	2931.64	1.65	4837.22

ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
20	Alisado de pisos con aditivo endurecedor de superficies	M2	907.79	5.29	4802.21
21	Tapas de hormigón simple f'c=210 kg/cm2 para canal de A=0.27cm E=5cm (ML)	ML	0.00	8.31	0.00
22	Rejilla de pletina 30 por 3mm ángulo 30 por 3mm A:27cm incluye cerco (ML)	ML	2.00	29.77	59.54
23	Pasamano tubo poste 2" E:2mm, pintura anticorrosiva y pintura esmalte	ML	22.30	33.56	748.39
24	Tubería poste galvanizado D:2" E:2mm (colocados en bordes de rampas)	M	50.40	6.04	304.42
25	Ángulo de 40 por 40 por 3mm para filos de rampa	M	68.75	3.30	226.88
26	Geotextil para subdrenes NT 1600 (ML)	ML	220.80	2.48	547.58
27	Material filtrante	M3	41.41	23.26	963.20
28	Tubería PVC tipo B Ø 160mm para subdren (ML)	ML	55.20	8.45	466.44
29	Rasanteo de zanja (ML)	ML	59.80	0.95	56.81
30	Pozo de revisión de hormigón simple f'c=210 kg/cm2 H=0.80-2.50m incluye encofrado tapa y H.F Ø=600mm	U	2	635.63	1271.26
31	Caja de revisión de hormigón simple f'c=180 kg/cm2 H=0.80-1.00m)+tapa de H.A con cerco metálico, espesor de pared 0.10m, sección libre de 0.6x0.6m, incluye encofrado y tapa H.F Ø=600mm	U		137.56	0.00
32	Suministro e instalación tubería perfilada para alcantarillado tipo B Ø1=160mm, rigidez anular≥4Pa (ML)	ML	11.00	11.54	126.94
33	Suministro e instalación tubería perfilada para alcantarillado tipo B Ø1=200mm, rigidez anular≥4Pa (ML)	ML	0.00	18.98	0.00
				TOTAL \$	80492.00

3. CONDICIONES OPERATIVAS:

- 3.1. La obra se inició con los trabajos de replanteo y nivelación de la obra proyectada.
- 3.2. Se procedió con la rotura de piso y excavación para la fundición de plintos y columnas.
- 3.3. Se fundió la losa del inicio de la pista y posteriormente las demás rampas
- 3.4. Además se colocó el relleno del piso debidamente compactado de toda la pista
- 3.5. Se ejecutó la limpieza final correspondiente.

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Monto del anticipo:	\$ 24.148.26 USD.
Total ejecutado en las tres planillas única:	\$ 80.492,00 USD
Porcentaje de trabajos ejecutados en las tres planillas	99.997 %

El valor del anticipo se devenga, los valores a cancelar se encuentra detallado de acuerdo al cuadro adjunto.

RESUMEN DE PLANILLAS

PLANILLA No.	SUB-TOTAL	12% IVA	TOTAL	ANTICIPO	MULTAS	-1% I.R.	-30% (12%IVA)	LIQUIDO A PAGAR
1	12364.58	1483.75	13848.33	3709.37	0.00	123.65	445.12	9570.19
2	34191.67	4103.00	38294.67	10257.50	0.00	341.92	1230.90	26464.35
3 (FINAL)	33935.75	4072.29	38008.04	10181.39	0.00	339.36	1221.69	26265.60
TOTAL	80492.00	9659.04	90151.04	24146.26	0.00	804.93	2897.71	62300.14

5. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO:

El plazo para la terminación de la obra es de NOVENTA DIAS, calendarios contados a partir de la suscripción del contrato. De esta manera se ha establecido las siguientes liquidaciones de plazo:

Plazo de ejecución	90 a partir der la suscripción del contrato
Firma del contrato	06 de febrero de 2018
Fecha de entrega del anticipo	22 de mayo de 2018
Fecha de inicio contractual de la obra	07 de febrero de 2018
Fecha de paralización de la obra	07 de febrero de 2018
Fecha de reinicio de los trabajos	04 de abril de 2018
Días paralizados	56 días
Fecha de terminación del plazo contractual	07 de mayo de 2018
Fecha de terminación del contrato más paralización	02 de julio de 2018
Período de ejecución	01 de junio al 02 de julio de 2018
Días de mora	0

La obra fue concluida el 02 de julio de 2018, y se ha cumplido con el objeto del contrato dentro del plazo, por lo que el Contratista no ha incurrido en mora de plazo.

6. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.

- 6.1. El Administrador del contrato ingeniero Ángel Garcés Ortega, conjuntamente con el Contratista y la delegada del Municipio de Loja, Ing. Carmen Maza Reinoso, realizaron el recorrido donde se ejecutaron los trabajo de obra, en ella se observa que los mismos han sido mantenidos y No se encuentra ninguna observación.

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

- 7.1. Las cantidades reales ejecutadas se reflejan en las planillas de Obra, la misma que fueron ejecutadas dentro de los términos y plazos establecidos en el Contrato.
- 7.2. Realizada la inspección de la obra, se constata que la misma se ha ejecutado de conformidad a las

especificaciones técnicas establecidas para éste tipo de trabajos, así como las determinadas por la Gerencia de Obras Públicas y la Fiscalización. Pero seguirá siendo responsabilidad del Contratista cualquier vicio oculto de ejecución que por su naturaleza, no son visibles a simple vista, hasta cuando lo determine la ley.

8. REAJUSTE DE PRECIOS O PENDIENTES DE PAGO

- 8.1. De acuerdo a la cláusula **UNDÉCIMA** del contrato se estipula lo siguiente: "el presente proceso no contempla el pago por reajuste de precios".

9. OTRAS:

- 9.1. El acta de recepción definitiva se suscribirá transcurridos 180 días, contados a partir de la firma de la presente Acta de recepción provisional.
- 9.2. Al estar el Contratista conforme con la liquidación económica, renuncia a realizar reclamo judicial alguno contra la Entidad Contratante.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, los comisionados firman en original y cuatro copias de igual tenor en la ciudad de Loja, a los 26 días del mes de Julio de 2018.

ING. ANGEL GARCÉS ORTEGA
ADMINISTRADOR


ING. JORGE MONTAÑO ORDÓÑEZ
FISCALIZADOR

ING. CARMEN MAZA REINOSO
DELEGADA COMISIÓN

ING. RODMAN OSCAR RUIZ LUDENA
CONTRATISTA.

SECRETARIO DE OO.PP.MM.

CERTIFICA: Que la presente Acta fue aprobada a los 26 días del mes de Julio del año dos mil diez y ocho.

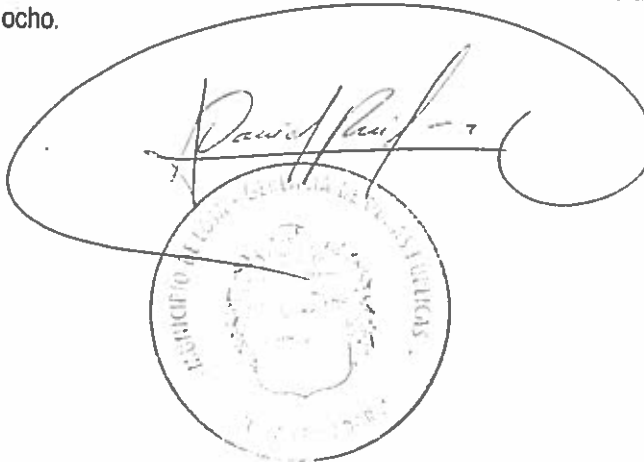

10
